



Réunion publique du 15 mars 2023

PROJET ROUTE DE LA CORNICHE :

Présentation de la phase travaux : planning, organisation, circulations



A scenic view of a lake with mountains in the background and a seagull in the foreground. The sky is blue with some clouds. The water is calm with a few buoys. A seagull is flying in the foreground.

Introduction :
Mme Vanessa Bruno,
Maire de Veyrier-du-Lac

1. Objectifs / portée du projet

Réseaux secs

- Ligne aérienne
Moyenne tension
ENEDIS
- Réseaux téléphoniques
(fibre), électricité basse
tension et éclairage
public (Commune et
Syane)


Réseaux humides

- Adduction d'eau ultra-
filtrée vers Menthon
et Talloires (Grand
Annecy)
- Reprise /
redimensionnement
du réseau d'eau
pluviale (Commune +
Grand Annecy)

Voirie


- Améliorer la sécurité
des déplacements :
création d'un nouveau
profil de voirie
véhicules/piétons/
cyclistes
- Réduire la vitesse /
circulation apaisée
- Limiter le délestage
- Valoriser la promenade
panoramique

LA MAITRISE D'OUVRAGE- Aménagement de voirie, renforcement des réseaux humides - Enfouissement des réseaux secs & de la ligne HTA

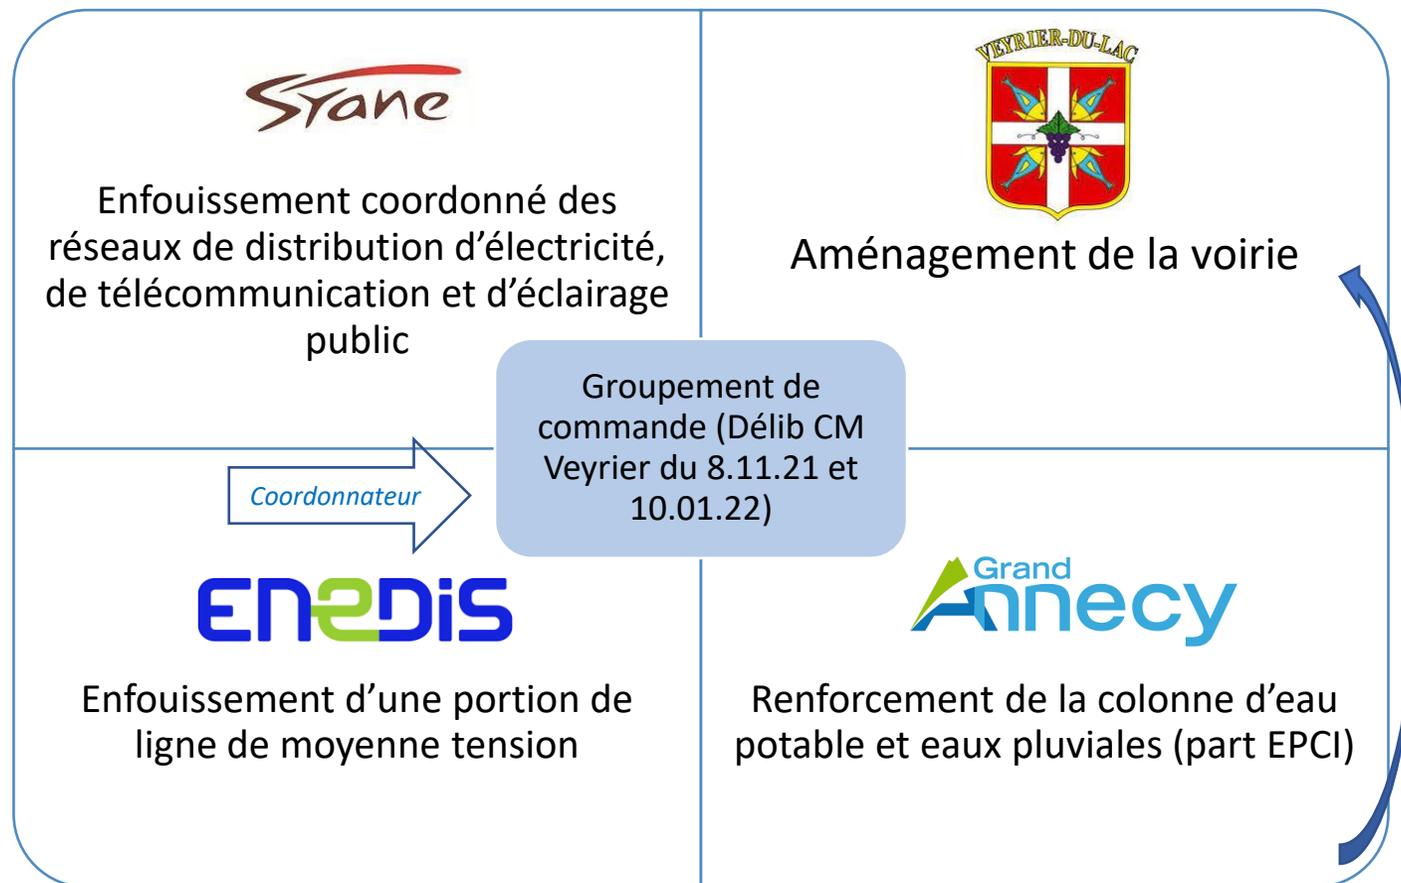

Transfert de maîtrise d'ouvrage eaux pluviales (délib. CM Veyrier du 30.05.2022) et refacturation au Grand Annecy de la part correspondante

2- Rappel de l'emprise des travaux

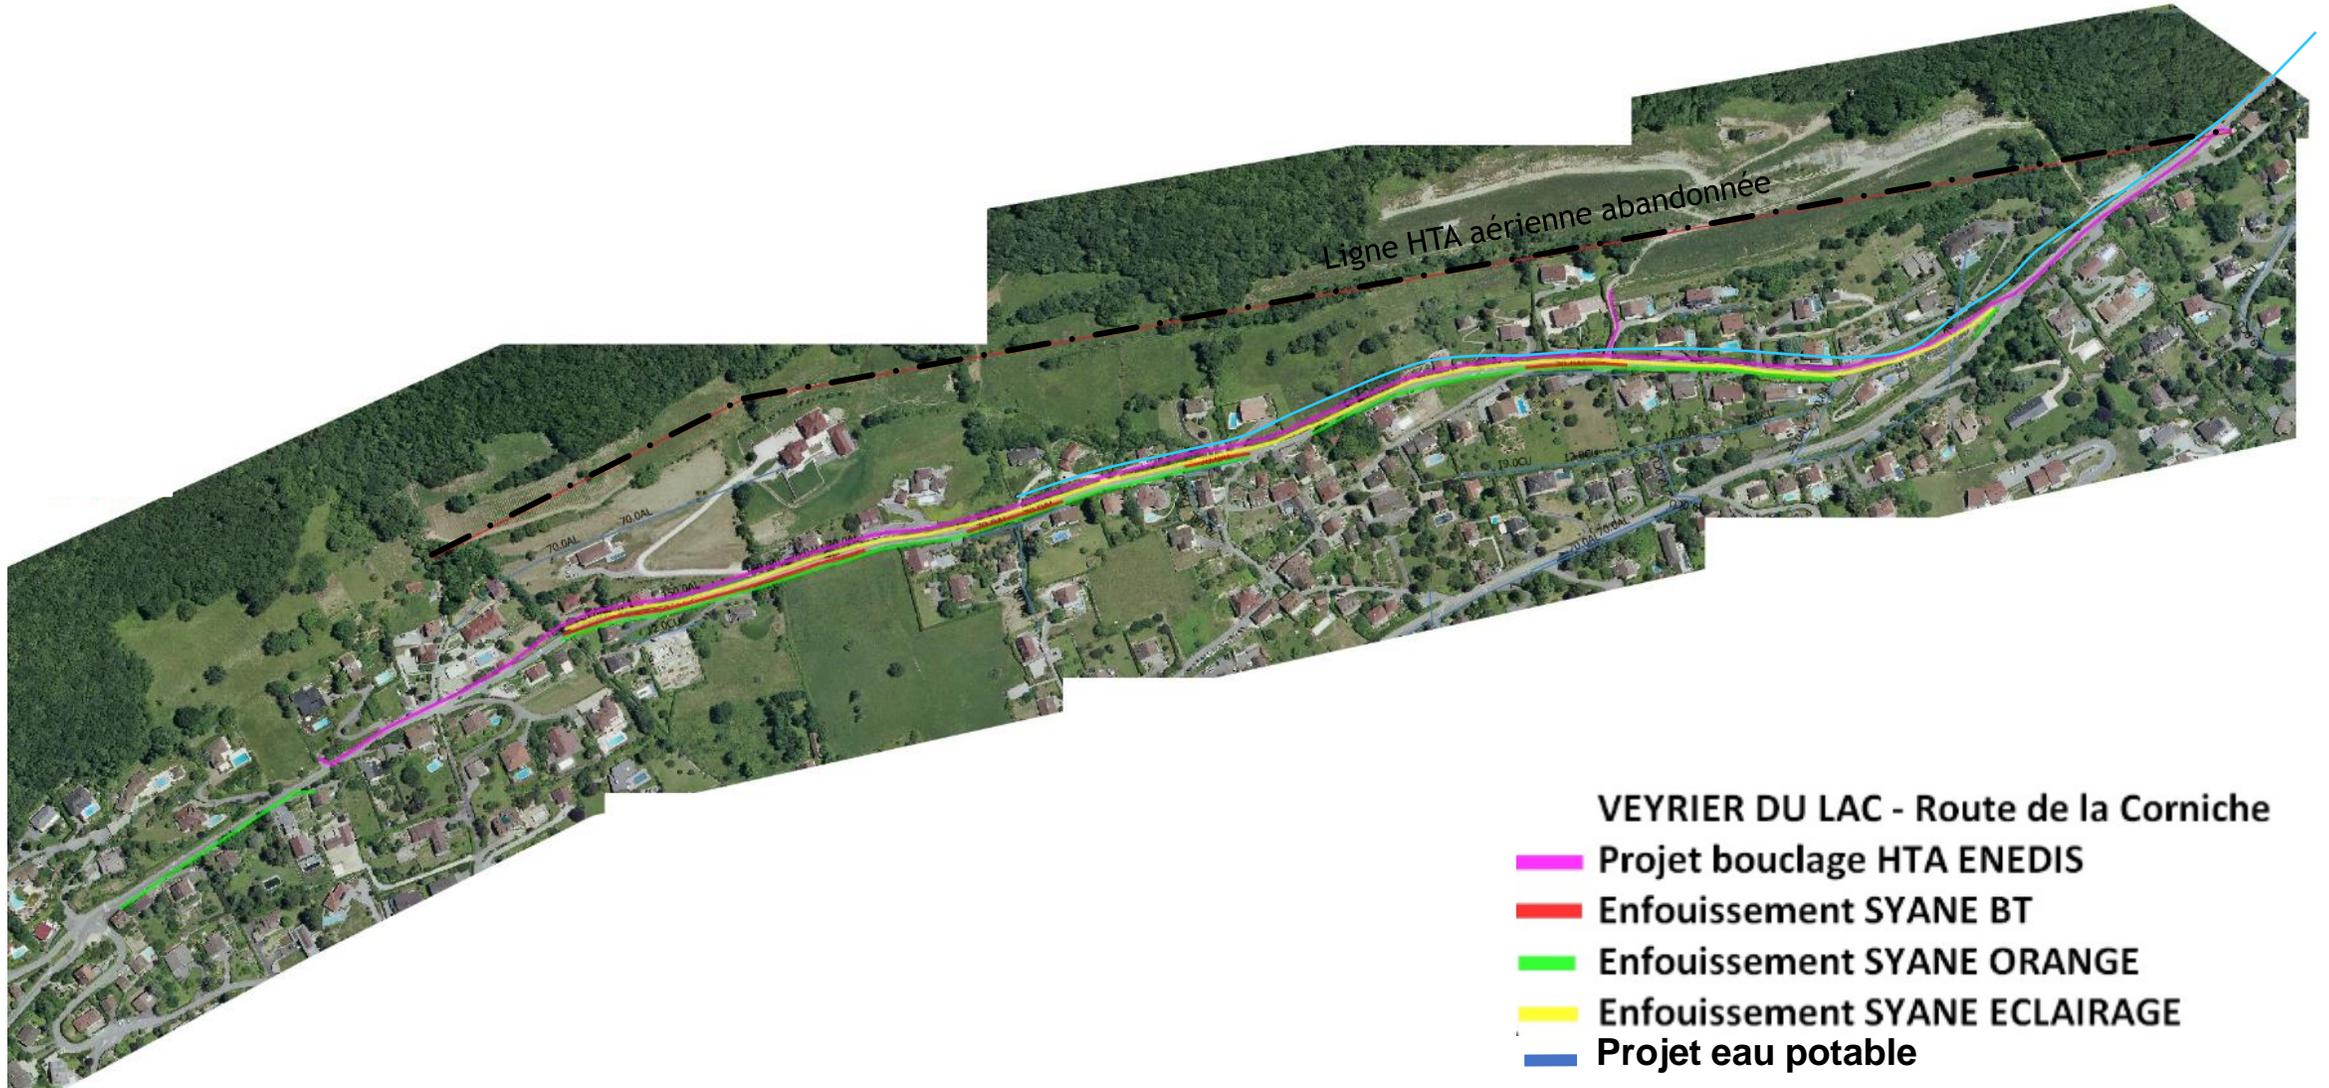

3- Les trois tranches de travaux

- Tranche Ferme :
 - De la RD909 au chemin des Mottes : 770m
 - Durée estimée : 12 mois
- Tranche optionnelle 1 :
 - Du chemin des Mottes au ruisseau du Baret : 350m
 - Durée estimée : 7 mois
- Tranche optionnelle 2 :
 - Du ruisseau du Baret au croisement route des Daudes : 400m
 - Durée estimée : 10 mois

4- Attribution des lots : commission d'appel d'offre du 9 janvier 2023

- Lot n°1 : Terrassement, VRD : attribué au groupement **CECCON / MITHIEUX / BIANCO**
- Lot n°2 : Bordures – Enrobés : attribué à **EUROVIA Alpes**
- Lot n°3 : Génie Électrique : attribué au groupement **CECCON / HTBS**

5- Coût prévisionnel des travaux

	<i>en k€ / Hors TVA</i>	Lot 1 - VRD TERRASSEMENT	Lot 2 - BORDURES - ENROBES	Lot 3 - GENIE ELECTRIQUE	Assistance maitrise d'œuvre	TOTAL PROJET HT
Commune (Brut)	Voirie et eaux pluviales	873	444	511	44	1 872
Grand Annecy	Eaux pluviales	462	27		16	505
Commune (Net)		411	418	511	28	1 367
Syane (Net)	Réseaux secs et éclairage public			179		179
Grand Annecy	Eau potable	1 043	22			1 064
Enedis	Ligne HTA 20kv	126	24	???		150
	TOTAL PROJET	2 042	490	690	44	3 266

6- Planning prévisionnel des travaux

<i>Tranche</i>	<i>de</i>	<i>à</i>	<i>Début</i>	<i>Interruption</i>	<i>Fin</i>
Tranche Ferme	RD909	Chemin des Mottes	20/03/23	du 8/07 au 27/08	22/12/23
Tranche O1	Chemin des Mottes	Ruisseau du Baret	Janvier 2024		Juin 2024
Tranche O2	Ruisseau du Baret	Croisement Rte des Daudes	20/04/23	du 8/07 au 27/08	Au + tard 22/12/23
Travaux eau potable RD 909	Croisement RD	RD entrée Menthon	20/03/23		15/04/23

7- Implantation du chantier

- Création d'une zone de stockage au croisement RD 909 jusqu'en haut du parking - Fermeture de la route de la Corniche dans cette zone
- Condamnation des PAV parking route de la Corniche



7- Implantation du chantier

- Implantation d'une base de vie sur le parking de la patte d'Oie + PAV




7- Implantation du chantier

- Implantation d'une zone de stockage au croisement de la route des Daudes + PAV



7- Implantation du chantier

- Création de 2 zones de PAV provisoires : au croisement route des Daudes et au parking de la patte d'oie

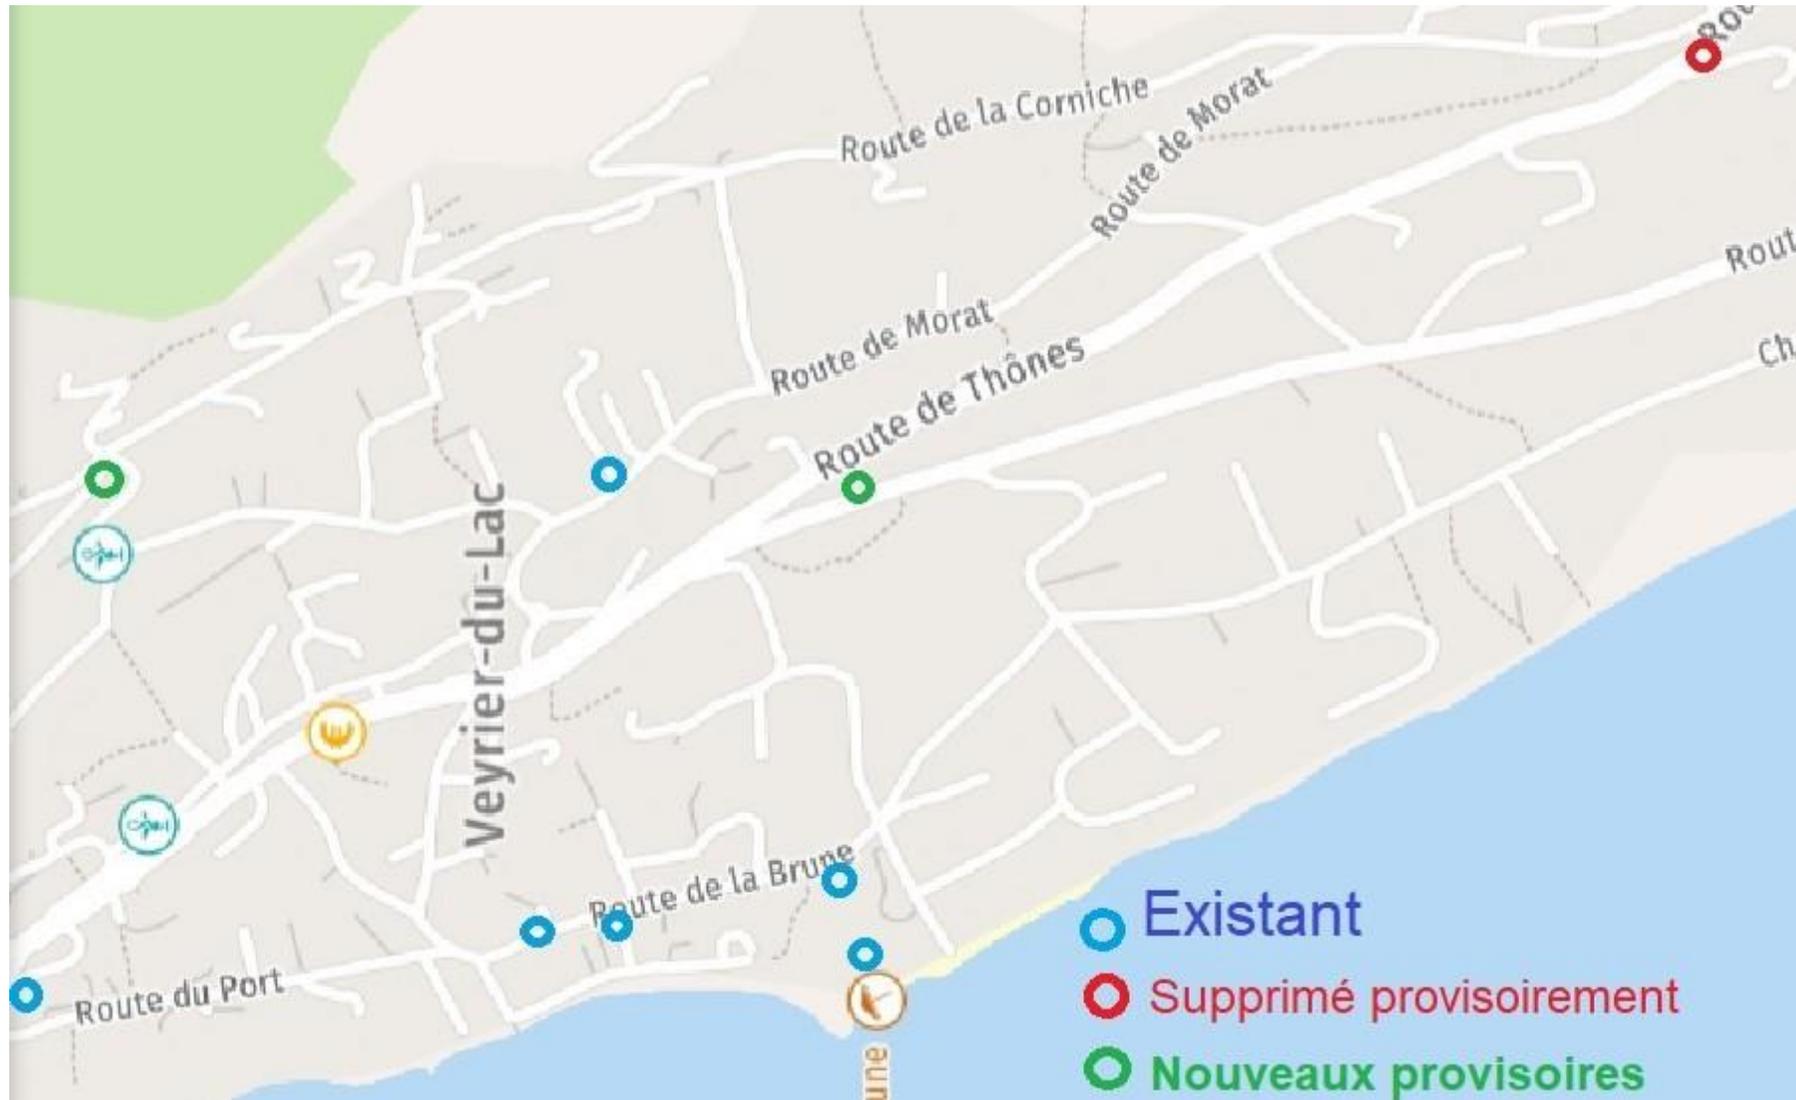

8- Accès riverains et stationnement

Au fur et à mesure de l'avancement du chantier :

- Interdiction d'accès route de la Corniche depuis *route de Morat*
- Interdiction d'accès route de la Corniche depuis *chemin des Sarrasins*
- Condamnation *escalier des Mottes*
- Interdiction d'accès route de la Corniche depuis *chemin du Péril*
- Etc ..

Et surtout : circulation automobile restreinte aux riverains dans la zone de travaux

Accès aux propriétés privées assurées chaque matin et chaque soir, la gestion des restrictions à l'avancement sera faite par les entreprises directement sur place et en liaison avec les riverains

9- Vos interlocuteurs pendant les travaux

Laisser vos messages à l'accueil de la mairie :

accueilst@veyrier-du-lac.fr

tel : 04 50 60 10 13

M. Patrick MAGNIN : dt@veyrier-du-lac.fr *conseiller délégué en charge du suivi opérationnel du projet*

M. Michel MADAR : adjoint.travaux@veyrier-du-lac.fr
maire-adjoint en charge des travaux et de l'urbanisme

MERCI DE NE PAS INTERVENIR PENDANT LES REUNIONS DE CHANTIER

QUESTIONS / REPONSES

Merci de votre Attention...

